



★ 5月8日 (火)

今日、午後5時過ぎからようやく作業開始です。

・ ベニヤ板9枚に型紙用の格子線を引く作業

ベニヤ板のセンターを出し、型紙を当ててピンでマーキング。慣れないので、なかなか大変。金尺の1mものは必需品。ボールペンは水性が良いか? まあ、百均のものでも十分だとは思うが。インクが手につくし、金尺にもついて、相当汚くなる。こまめにふき取る。

2枚目以降は、センター線を鉛筆で引く。作業がしやすくなるし、すぐに消えるというか、見えにくくなる。

やりながらわかったのだが、押しピンでマーキングするときは紙を右・左と互い違いに180度回転させながら、マークしていけば速い。

午後7時半ころまで、約2時間20分で作業を中断。たった6枚しか線が引けない。まあ、初めてなのではしょうがないが、この作業は重要なので、ゆっくりやっっていこうと思う。

★ 5月11日 (金)

午後5時過ぎから作業開始。今日は残り3枚の格子を書き込む予定。ざっと1時間かな? Sさんのカヤックづくりに助言したりで終わったのは午後7時過ぎ。でもまあ、1枚20分程度で書けるようにはなった。

※ これまでの作業時間：9枚の格子をけがく：約200分



★ 5月15日 (火)

1週間ぶり。午後5時過ぎから作業を開始。

・ ベニヤ板に当てる型紙の穴の補強作業

セロテープでやってみたが、持ちが悪いので絆創膏にする。

布製なので、ばっちりのはず。1 Cm ほどに切って止めるのだが、35枚×4隅×2セットなので、結構大変。この作業は重要なので、ゆっくりやっっていこうと思う。

終了したのは7時過ぎ1時間40分ほどかかった。カヤック作りを手伝ったりしたので、遅くなってしまいました。

※ 今回の作業時間：押しピン用穴の補強：約100分

★ 5月22日（火）

1週間ぶり。今日の作業はけがき。ようやく部品の線を書き始める。

・ 図面の固定

最初は、型紙を全部並べ、画鋲で固定し、一気にポイントをマーキングすることを考え、やってみたが、ちょっと無理。やはり1枚ずつ、画鋲で留めて転写することにした。

この作業はとても大切なので、時間がかかるが、地道にやっっていくしかない。がんばろう。



絆創膏は、ばっちり。画鋲で留める前に、千枚通しで下穴をあけると良い。線は少しずれるようだが、まあ、組み立てで修正できるでしょう。

押しピンの跡はとても見えにくいので、ネームペンでポイントを打つようにしました。型紙を完全にはずす前に、片側からめくって確認しながらポイントを打ちます。

押しピンの跡だけを残しておいて、最後に全部線を引くのは大変なので、引ける線はその都度引いていきました。長い線は、ポイントがそろってから、もう一度引き直しました。

最初の1枚目に35枚の型紙全部を写し終わったら、2時間10分たっていました。2枚目からはもう少し早くやりたい・・・。

※ 今回の作業時間：1枚目の転写：130分

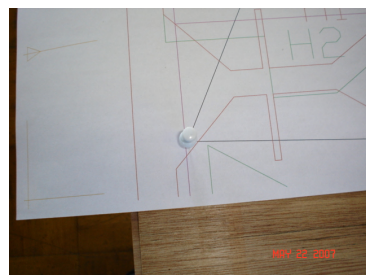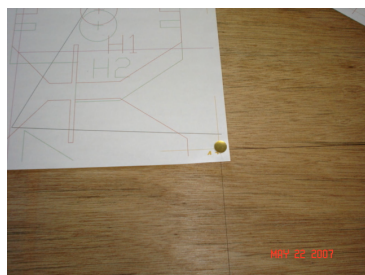

★ 5月23日（水）

今日も昨日に引き続きけがき。昨日は時間がかかったので、今日はできるだけ早くやりたいという希望・・・。

思ったよりも型紙で引いた方眼が正確ではなかったようです。うーん、方眼は、はかり方を工夫して、定規で引いた方が良かったかも。

最初の1枚目に35枚の型紙全部を写し終わったら、1時間。やはり早くできた、と思ったら、単に簡単なものだっただけで、結局今日は、2/5で終わり。2時間10分たっていました。やっぱりそんなものだなあ。

※ 今回の作業時間：2枚目と3枚目の2/5の転写：130分

★ 5月24日（木）

今日も昨日に引き続きけがき。昨日の残り3/5。思ったよりも型紙で作った方眼が正確ではない。うーん、合わない。

残り全部を写し終わったら、やはり2時間。今日も7時半過ぎ。昨日は早くできたと思ったら、単に簡単な図だっただけで、やっぱりそんなものだなあ。疲れしました。

※ 今回の作業時間：昨日の残り、3/5の転写：130分

★ 5月31日（木）

引き続きけがき。4枚目の1/5だけ。30分しかできなかった。

★ 6月4日（月）

引き続きけがき。4枚目の4/5を完了。5時15分から6時半過ぎ。もう少しできそうだったので、5枚目をけがいたら、あっという間に8時を過ぎ、9時前によく終わりました。やはり、1枚2時間くらいかかるようです。

残りは4枚。今週中に終わりたいなあ。

★ 7月5日（木）

午後6時半。ようやくすべてのけがきが終わりました。残りの4枚。1ヶ月かかったこととなります。なかなか時間が取れませんでした。少しずつしかやれず、しっかり記録をしていなかったのが時間も不明です。1枚2時間はかかった気がする・・・。

こんな調子では、切断が終わるのはいつなのでしょう。

なんか、今シーズンには間に合わないような気がしてきた・・・。




★ 7月18日(水)

だいぶ間が空きましたが、今日から切断開始。まず一番簡単そうなVの板からです。切断・かんながけで、約50分。まあまあのできになりました。

直線部分はノコギリがよいようです。溝になる部分は胴付ノコギリで切断しました。これだと線の上を切っても、ほとんど問題はないと思います。

簡単な部品なのですが、結構時間がかかりそうですね。

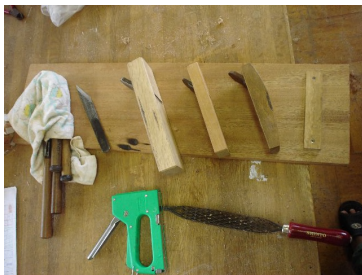

★ 7月24日(火)

今日はIVの板です。切断だけでしたが、40分で終了。かんながけと溝の加工はできませんでした。

★ 7月25日(水)

昨日のIVの板のかんながけと溝加工です。65分ほどかかりました。細かい仕事が入ると結構時間がかかります。溝の加工は、胴付ノコギリ、金工ヤスリ、木工ヤスリ、切り出し、ハンドドリルなどを使い慎重にやりました。金工ヤスリは目が細かく少しずつ削るのに便利です。

続いてIIIの部品を切断中に、やってしまいました。よそ見をしていたら間違えて切断してしまいました。エポキシで裏から板を当てて補修です。トホホ。

切断40分部品加工40分くらいでした。補修は明日かな？

